

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๒๔/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๓๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งที่ ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท ทีแพค แอสฟัลท์ติก แอนด์คอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายสุริยา นามบริบูรณ์ ผู้รับมอบอำนาจจากนายทวีผล ศรีบุญปวน มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๑๑๙๙๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านห่อมต้อ หมู่ที่ ๕ - บ้านปวงคำ หมู่ที่ ๙ (ทต. ลี้) เชื่อมบ้าน ลี้ หมู่ที่ ๖ (ทต. วังดิน) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ในวงเงิน ๒,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น


บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ตามแนวทางปฏิบัติของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่วนที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตรารับปรับเป็นร้อยละ ๐ ดังนี้

๑. ปรับแผนการทำงานใหม่ และจัดทำแผนการทำงานขึ้นใหม่ เนื่องจากเป็นสัญญาที่ยังไม่เคยมีแผนการทำงานแนบท้ายสัญญามาก่อน และเป็นสัญญาที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว โดยกำหนดวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้คู่สัญญาเริ่มปฏิบัติงานตามแผนงานใหม่และสิ้นสุดการทำงานวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๗๗ วัน ทั้งนี้ แผนการทำงาน จำนวน ๑ แผน ที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒. สัญญาครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว

๒.๑ หากสัญญามีผลการดำเนินงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะใช้สิทธิในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสุริยา นามบริบูรณ์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

๒.๒ หากสัญญาามีผลการดำเนินการล่าช้าแต่ยังไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะพิจารณาออกเลิกสัญญาตามที่เห็นสมควร

๓. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดนอกจากนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
TPAC ASPHALT & CONCRETE CO.,LTD.
(นายสุรียา นาบรีบูรณ์)


(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

ปรับแผนการทำงานใหม่

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านส้มดัด หมู่ที่ 5 - บ้านปวงคำ หมู่ที่ 9 (ทด.ล.) เชื่อมบ้านลี้ หมู่ที่ 6 (ทด.วังดิน) ฝ้าเกษตร จังหวัดลำพูน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานพื้นทาง					
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	358.25	45.71	16,375.61	0.66
	- งานดินถมคืนทาง	ลบ.ม.	138.00	45.49	6,277.62	0.25
	- งานวางน้ำและขุดต่อขนาดเบา	ลบ.ม.	3,100.00	1.72	5,332.00	0.21
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	697.50	694.59	484,476.53	19.46
2	งานผิวทาง					
	- งานลาดยางไฟรมโติด	ตร.ม.	4,650.00	31.53	146,614.50	5.89
	- งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	4,650.00	253.73	1,179,844.50	47.38
	- งานเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	174.38	290.00	50,570.20	2.03
3	ค่าแรง+ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษี+อื่นๆ	งาน	1.00	600,509.05	600,509.05	24.12
				รวม	2,490,000.00	100.00

	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66			
Money	36,992.86	484,476.53	1,968,530.61					
AccMoney	36,992.86	484,476.53	1,968,530.61					
% PLAN	1%	19%	80%					
% ACC PLAN	1%	20%	100%					
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								

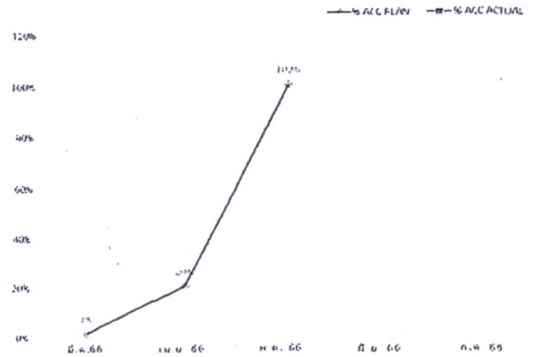

เริ่ม 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสุพรรณ อุณจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพิเศษ จันทร์ศิริ)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายคณวัฒน์ วงษ์แดง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
TPAC
TPAC ASPHALTIC & CONCRETE CO., LTD.
